

RES Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek


Algemeen	
Aan	PFO Milieu en Duurzaamheid
Van	Simon Miske
Datum	13-6-2022
Verspreiden	Ja
Kenmerk	22.0002780

Wat was afgesproken

Het Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid heeft op 4 maart 2022 afgesproken om voor de regio Gooi en Vechtstreek en RES Uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit omdat het uitvoeringsprogramma op het niveau van de energieregio Noord Holland Zuid te algemeen en op een te hoog abstractieniveau is geschreven. Hiermee is niet volledig duidelijk wat dit betekent voor gemeenten. Een RES Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek geeft een totaaloverzicht wat er gebeurd op lokaal en regionaal niveau en geeft inzicht in de bijdrage aan de 199 GWh in de RES NHZ 1.0. Het maakt bovendien (bij)sturing op inhoud en proces mogelijk. Planning was om het uitvoeringsprogramma te agenderen tijdens het PFO van 8 juli.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op het moment van schrijven hebben er drie werksessies plaats gevonden. Daarbij is de uitgangssituatie in beeld gebracht en hebben we samen met stakeholders inhoudelijk het verder uitgewerkt (stap 1,2 en 3 uit onderstaand schema).

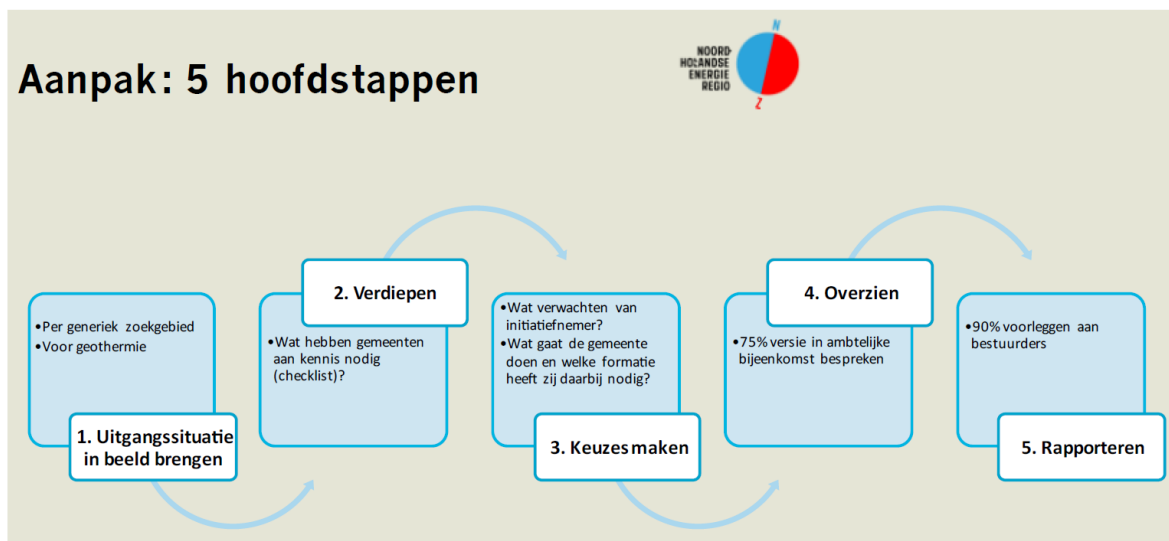

Vanuit het RES Programma NHZ worden we ondersteund bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma door adviesbureau RH-DHV. De werkgroep bestaat uit de Regio en gemeenten Hilversum en Gooise Meren.

Het RES Uitvoeringsprogramma gaat over Elektriciteit en Warmte. Bij warmte ligt de focus op de bovengemeentelijke bron geothermie en de bijpassende infrastructuur. Voor uitwerking van dit

onderdeel worden we ondersteund door het Servicepunt Duurzame Energie. De eerste werksessie heeft plaats gevonden, de tweede staat gepland.

Meer tijd nodig

De verzending van de vergaderstukken van het PFO 8 juli is op 15 juni. Dit blijkt niet haalbaar omdat:

- afstemming met en het plannen van afspraken (met stakeholders) meer tijd vroeg dan gepland. De hele tijdsplanning was sowieso al ambitieus omdat het een oude planning was maar de start van het proces wat is vertraagd omdat er in het PFO van maart nog een keer extra over is gesproken. Pas daarna kon er gestart worden.
- de 2e werksessie over geothermie van 7 juni kon wegens ziekte van de begeleider niet doorgaan. De uitkomsten van dit adviestraject wordt in het uitvoeringsprogramma verwerkt. Nieuwe datum waarbij alle gemeenten aanwezig kunnen is 20 juni.
- de informatie vanuit gemeenten en stakeholders is nog niet compleet
- het uitvoeringsprogramma met 'stoom en kokend water' alsnog klaar te hebben voor de verzending van 15 juni zou ten koste gaan van de kwaliteit.
- ook als was het net klaar op 15 juni dan was er geen tijd geweest om het concept uitvoeringsprogramma te bespreken met alle gemeenten. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is om het concept met alle gemeenten te bespreken voordat deze wordt geagendeerd in het DO en PFO. Het is een uitvoeringsprogramma voor de hele regio, dus een breed draagvlak is belangrijk.

Nieuwe planning

Kwaliteit en draagvlak zijn erg belangrijk, daarom vindt de behandeling van het RES Uitvoeringsprogramma plaats in het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg op 16 september. Voordeel daarbij ook is dat het PFO dan volledig wordt gevormd door portefeuillehouders vanuit de nieuwe colleges.

Het 1e concept van het uitvoeringsprogramma zal op 30 juni klaar zijn en wordt begin juli met alle gemeenten besproken. Op basis hiervan wordt een 2e conceptversie gemaakt die in het Ambtelijk Overleg van 25 augustus wordt geagendeerd. Dan kunnen de laatste aanpassingen worden gedaan zodat die daarna door kan voor bespreking in het DO en ter besluitvorming in het PFO.
