

Toekomstbestendige Drinkwatervoorziening 't Gooi: WAAG

PFO regio 18 juli 2024

24-6-2024



WAAG: opgave

In de regio Gooi- en Vechtstreek staat het watersysteem en daarmee ook de toekomstbestendigheid van de drinkwatervoorziening onder druk, met name als het aankomt op productiecapaciteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en robuustheid alle in het licht van klimaatontwikkelingen, economische ontwikkelingen en vervuiling van bronnen.

De drie drinkwaterbedrijven in en rond 't Gooi slaan de handen ineen en zetten gezamenlijk in op de realisatie van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Op dit moment zijn de prognoses zodanig dat er in 2035 extra capaciteit nodig is. De inzet is daarom 30 miljoen m³ drinkwater in & voor de regio te maken. Hiermee is WAAG mogelijk een van de grotere bijdragen aan de landelijke drinkwateropgave.



WAAG: unieke eigenschappen

- 't Gooi beschikt zijn op korte afstand over diverse oppervlaktewaterbronnen t.b.v. de drinkwatervoorziening met verschillende aanvoerroutes (Amsterdam-RijnKanaal, Gooimeer en Eemmeer).
- Er is een zoet grondwatersysteem met een (in potentie) grote bufferende werking onder de heuvelrug beschikbaar.
- Er liggen al verbindingen tussen de drinkwaternetwerken die 'eenvoudig' kunnen worden vergroot.



Waar gaat het om?

Uit de voorbereidingsfase is gebleken dat er de onderzochte bouwstenen samen tot een haalbaar concept kunnen leiden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de opgave vorm te geven. De ruimtelijke inpassing ligt daardoor niet vast, in de verkenningsfase wordt hiervoor een studie uitgevoerd: onderzoek naar en opstellen van een voorkeursalternatief (VKA).

Op dit moment is dus **niet duidelijk** welke partijen bevoegd gezag zullen zijn. Provincie Noord-Holland is de enige partij die zeker bevoegd gezag zal zijn (voor 1 of meerdere activiteiten).


Naast de technische bouwstenen willen de drinkwaterbedrijven met belanghebbenden afspraken maken over meerwaarde voor belanghebbenden die door dit project gerealiseerd kan worden.



Technische bouwstenen:

-  oppervlaktewaterbron
-  aard voorzuivering
-  locatie voorzuivering
-  aanvoer
-  grondwaterwinning
-  grondwater aanvulling
-  nazuivering
-  aansluiting bestaand net

Verschillende mogelijke indicatieve ruimtelijke liggingen bouwstenen:

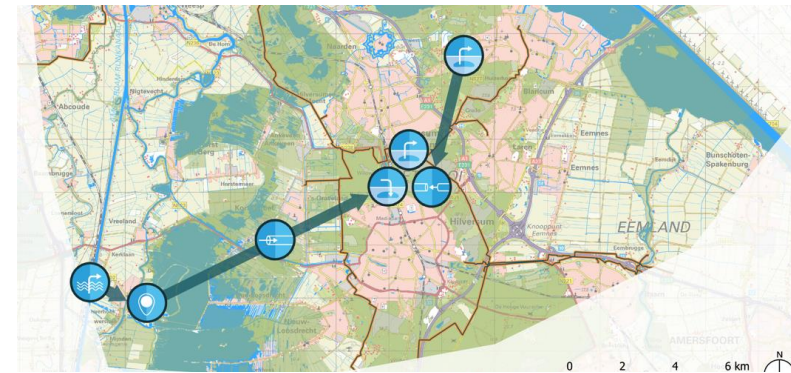

Samenwerking voor ruimtelijke besluiten

Een robuust & toekomstbestendig systeem vergt een bovenlokale ruimtelijke afweging voor zowel het watersysteem als de ruimtelijke inpassing. WAAG raakt aan verschillende onderdelen van het watersysteem en heeft potentieel een behoorlijke ruimtelijke impact. Gezamenlijkheid is nodig voor behouden tempo en daarmee behalen opgave WAAG (relatie met opgave woningbouw).

Pas bij vaststelling van het voorkeursalternatief (VKA) is er meer zicht op welke bevoegde gezagen betrokken een rol hebben.

Potentieel zijn dit : 3 provincies, RWS, 9 gemeenten en 3 waterschappen. Provincie Noord-Holland is in elk geval een van de bevoegde gezagen.

Een gezamenlijke besluit over het proces door potentiële bevoegde gezagen is nodig om voldoende zekerheid te hebben dat de bevoegde gezagen de benodigde informatie hebben om een voorkeursbeslissing te kunnen nemen.



Planning & Besluitvorming

Er zijn 3 fasen te onderscheiden tot aan oplevering (zie ook dia hierover).

In analogie met de MIRT-systematiek zijn dit:

- 2024-2027: verkenning tot VKA
- 2028-2029: planuitwerking & formele besluitvorming
- 2030-2035: aanlegfase



De initiatiefnemer is hierbij géén overheid maar een samenwerkingsverbond tussen 3 drinkwaterbedrijven: PWN, Vitens en Waternet.

Bevoegd gezag zijn verschillende overheden.

Voorgaande, in combinatie met de inhoudelijke opgave, vereist een specifieke afspraak over het te doorlopen proces en de te doorlopen procedures.



Besluitvorming- proces voorstel

Het detailniveau dat in de verkenningsfase geleverd kan worden is het niveau van een Schets Ontwerp. Om tot een Definitief Ontwerp te komen hebben de drinkwaterbedrijven zekerheid nodig over de ruimtelijke inpassing. Hiervoor is draagvlak bij de overheden essentieel.

Na het schetsontwerp hebben de drinkwaterbedrijven een besluit nodig van bevoegde gezagen voor deze zekerheid. Dit kan in de vorm van een programma onder de Omgevingswet en een VoorKeursAlternatief en deze vast te stellen met een voorkeursbeslissing.

Voorstel: In een startbeslissing aan te geven dat er naar een voorkeursbeslissing wordt toegewerkt door de initiatiefnemer. De voorkeursbeslissing bestaat uit een beslissing over een programma (bv Drinkwater 't Gooi) en een VoorKeursAlternatief (o.b.v. een plan-mer). Zowel de startbeslissing als de voorkeursbeslissing wordt genomen door overheden.

Voorstel: om het proces tot aan de voorkeursbeslissing te begeleiden wordt een bestuurlijke kerngroep ingesteld. Dit wordt vastgelegd in een startbeslissing "Toekomstbestendige Drinkwatervoorziening 't Gooi".



2023 IN: WAAG kan oplossing bieden voor deel van de opgave drinkwatersector in de regio, start **verkenning**
Inregelen projectorganisatie, afbakening opgave, voorbereiden startbeslissing

2024 BG: Startbeslissing: het te volgen proces en de opgave voor WAAG & instelling Bestuurlijke Advies Groep

Opstellen programma (bv Drinkwater 't Gooi) & plan MER: onderzoek VoorkeursAlternatief

- Schetsontwerp (SO) voor:
- Innamepunt oppervlaktewater voor bereiding drinkwater
 - Gebruik grondwatersysteem Heuvelrug: mogelijke onttrekking en infiltratie
 - Zuiveringssysteem (incl. verwerking reststromen)
 - Locatie zuivering
 - Leiding tracé (transport en distributie)
 - Calamiteitenvoorziening

Overeenstemming over vormgeving meerwaarde projecten

2027 BG: Voorkeursbeslissing: vaststellen programma en besluit op VoorkeursAlternatief WAAG

IN: Investeringsbesluit I

- Bij positief besluit:
- Programma uitwerking incl. uitvoeringsstrategie
 - Van SO naar Definitief Ontwerp (DO) verschillende onderdelen WAAG
 - Incl. opstellen project MER

2028 BG: Projectbesluit

IN: Investeringsbesluit II

2029 IN: Voorbereiding uitvoeringsfase

2030-2035 ON: Uitvoering

BG= bevoegd gezag
IN= initiatiefnemer
ON= opdrachtnemer
Groen: werkzaamheden IN

- Participatie (tenminste):
Formeel:
• PlanMER en programma
Informeel:
• Consultatie Staten, Raden en AB
• Adviesraad maatschappelijke partijen
Evt. consultatie inwoners over afweging

- Participatie (tenminste):
Formeel:
• projectMER
• projectbesluit
Informeel:
• Consultatie Staten, Raden en AB
• Consultatie inwoners
• Adviesraad maatschappelijke partijen

Overzicht fasering WAAG

Participatie
Optimalisatie uitvoeringsniveau (direct betrokken bewoners en partijen)

Doel:
Benodigde informatie beschikbaar maken om tot een bestuurlijke voorkeursbeslissing te komen.

Programma uitwerking:
• bij integraal maatregelpakket: meerdere maatregelen uitwerken
• kan belegd zijn bij meerdere partijen.
• uitwerking in onderlinge samenhang (integraliteit & adaptiviteit borgen)
Evt. bestuursovereenkomst om draagvlak bij de uitvoeringsstrategie vast te leggen.



Mogelijke inhoud Besluit startbeslissing

Bevoegde gezagen* besluiten:

Samen te werken in het kader van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening 't Gooi. Dit vorm te geven door:

1. Een programma (bv Drinkwater 't Gooi) op te stellen;
 - a. Daarin tenminste de benodigde ruimte en kaders voor WAAG op te nemen (evt. onderdelen benoemen);
 - b. De drie drinkwaterbedrijven vragen deze inhoudelijk vorm te geven o.l.v. een programmaleider van provincie Noord-Holland;
2. Op basis van een plan-mer een voorkeursalternatief vast te stellen;
3. Ter begeleiding van het proces een bestuurlijke adviesgroep in te stellen;
4. In gezamenlijkheid in 2027 een voorkeursbeslissing te nemen over programma en over het voorkeursalternatief voor WAAG.

* Zie voorstel invulling sheet hierna



Voorstel invulling Bestuurlijke kerngroep

Rol bestuurlijke kerngroep:

- Adviserend aan provincie Noord-Holland
- Alternatief: adviserend aan initiatiefnemer

Deelnemende organisaties (incl. rol: consensus of adviserend):

Besluiten in consensus (mogelijk of waarschijnlijk belanghebbende BG'en):

Provincies Noord-Holland (vz kerngroep) & Utrecht, Flevoland, RWS, Waterschappen Amstel Gooi & Vecht, Vallei & Veluwe. Gemeenten: Laren, Blaricum, Eemnes, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Wijde meren, Stichtse Vecht.

Wethouders, gedeputeerden en DB-leden nemen deel.

Adviserend aan kerngroep– besluiten niet (geen BG rol):

Goois Natuur Reservaat, Natuurmonumenten, LTO, Gastvrije randmeren

Waarschijnlijk geen belanghebbenden of alleen indirect (voorstel: geen rol in kerngroep):

Gem. Amsterdam, WS HDSR, gem. Almere



Voorstel planning Bestuurlijke adviesgroep

We voorzien nu 6 momenten voor de BAG:

Okt 2024: akkoord partijen op proces en bevoegd gezag

Voorjaar 2025: update over o.a. advies commissie mer

Najaar 2025: update over voorkeursalternatief

Midden 2026: oordeelsvorming partijen

Najaar 2026: update

Midden 2027: besluitvorming partijen

Ambtelijk, evt. bestuurlijk:

Najaar 2024: afstemming over Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(eerste stap in plan-mer)




Voorstel inhoud programma

Initiële contour programma

In het programma zullen in elk geval de benodigde onderdelen van WAAG een plek moeten krijgen (zie figuur).

Er kan gekozen worden om nu gelijk de initiële contour te verbreden. Het programma kan eventueel ook na vaststelling, bv na 10 jaar, gewijzigd worden (verbreed).

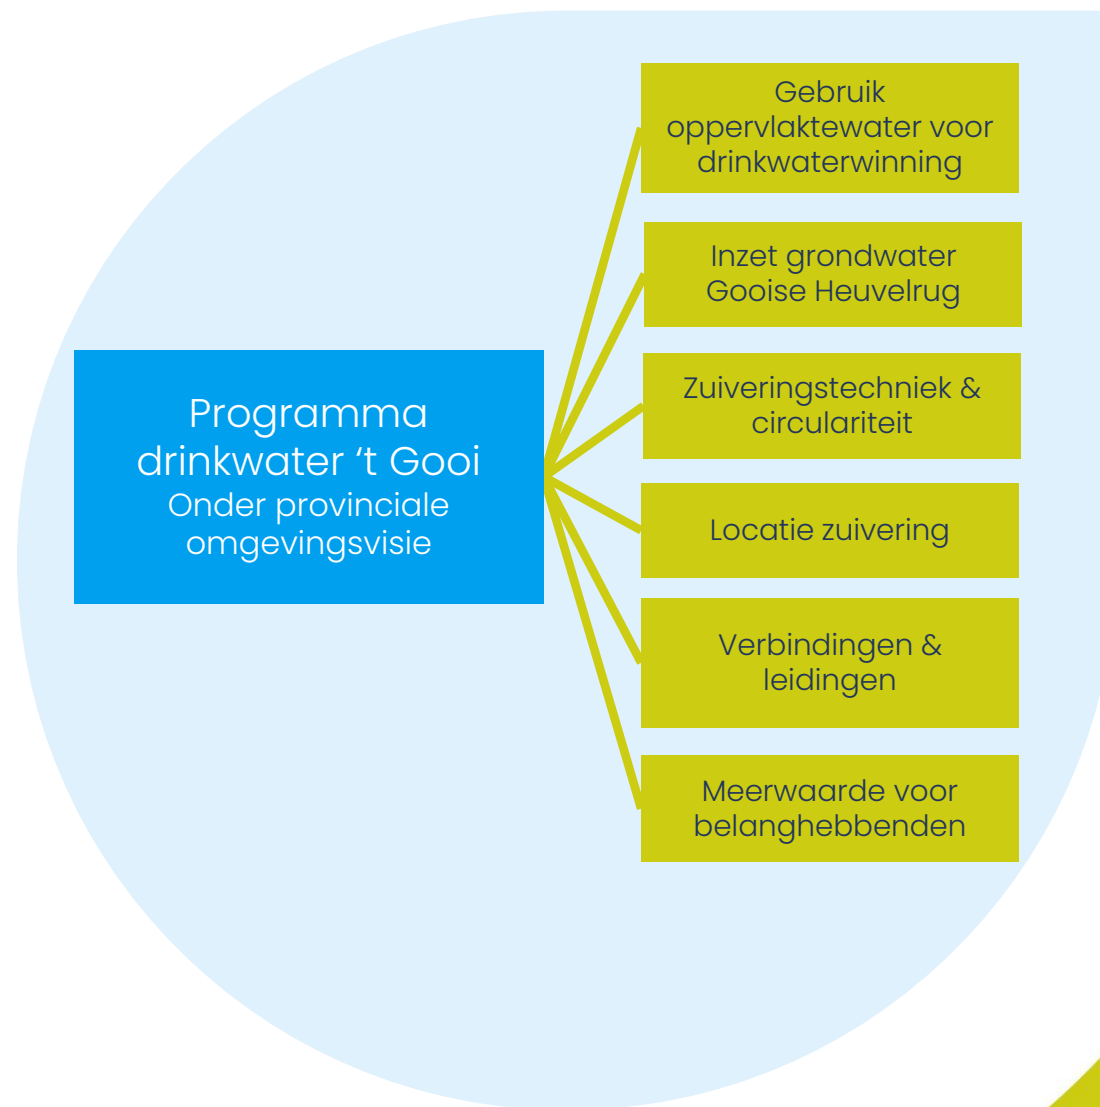

Vraag aan u

Wij verzoeken u deel te nemen in de bestuurlijke kerngroep

Op welke manier kunt u namens de gemeenten

Laren, Blaricum, Eemnes, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Wijde meren, Stichtse Vecht, invulling geven aan het verzoek van WAAG om deel te nemen aan de bestuurlijke kerngroep?

Individueel - wij verzoeken college's een afgevaardigde te leveren

Gezamenlijk - inrichten mandaat en terugkoppeling naar portefeuillehouders



WIE



WAT

ZOEKEN
NAAR



WAAR



WAAROM



NIEUWE
BRONNEN



HOE



Contactgegevens
Omgevingsmanager IPM WAAG
Tessa Peters
06 28 56 18 05
Tessa.peters@pwn.nl

